

Obec Bělkovice - Lašt'any
Bělkovice-Lašt'any č.p. 139
783 16 Dolany

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

V souladu s ust. § 81 odst. 5 Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „Zákon“)

Název zakázky:

Oprava místní komunikace k mateřské škole



Veřejný zadavatel podle § 2 odst.2 písm.c) zákona:

Obec Bělkovice - Lašt'any

Se sídlem: Bělkovice-Lašt'any č.p. 139, 783 16 Dolany

Zastoupená: Ing. Tomáš Němčic – starosta obce

IČ: 00298654

(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 151 zákona:

Osigeno s.r.o.

Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice

Office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk

IČ: 27761746, DIČ: CZ27761746

Zapsán v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 51144

statutární orgán: Ing. Tomáš Rýc - jednatel

(dále jen „administrátor“),

Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 odst.1 Zákona zasílá oznámení o přidělení veřejné zakázky.

Hodnotící komise při hodnocení nabídek postupovala v souladu s ust. § 79 Zákona a způsobem určeným v zadávací dokumentaci. Hodnocení proběhlo na základě kritéria nejnižší nabídková cena.

Nabídka uchazeče **STRABAG a.s., IČ: 60838744** s nabídkovou cenou **2.460.585,45 Kč bez**

DPH je dle zadání v zadávací dokumentaci nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou.

Pořadí hodnocených nabídek dle nabídkové ceny:


Pořadí	Název uchazeče	IČ	Sídlo	Cena bez DPH	Hodnocení v %	č. nab.
1.	STRABAG a.s.	60838744	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha	2.460.585,45	100	7.
2.	SWIETELSKY stavební s.r.o.	48035599	Jahodová ulice 60, 620 00 Brno	2.473.824,-	99,46	6.
3.	KARETA s.r.o.	62360213	Krnovská 51, 792 01 Bruntál	2.849.012,94	86,37	1.
4.	KOMUNIKACE CZ s.r.o.	03971694	Příkop 843/4, 602 00 Brno	2.926.769,27	84,07	4.
5.	M-SILNICE a.s.	42196868	Husova 1697, 530 03 Pardubice	2.980.802,70	82,55	2.
6.	DEMSTAV group s.r.o.	27844935	Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I - Město	3.774.978,98	65,18	3.

Zadavatel ze zadávacího řízení vyloučil nabídku uchazeče **DRAPLSTAV GROUP s.r.o.**, IČ: 01492853 se sídlem: U Hřiště 413, 768 32 Zborovice.

Současně oznamujeme, že zadavatel uzavře s vítěznou společností smlouvu.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bylo schváleno Radou obce Bělkovice - Laštiny dne 12.10.2016 usnesením č.j. 20/2016.

V Bělkovicích-Laštanech dne 17.10.2016


OBEC
Ing. Tomáš ČECH
IČ osoba: DIČ CZ00298654

Obec Bělkovice - Lašťany
Bělkovice-Lašťany č.p. 139
783 16 Dolany

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Název zakázky:

Oprava místní komunikace k mateřské škole

Veřejný zadavatel podle § 2 odst.2 písm.c) zákona č. 137/2006 Sb.

Obec Bělkovice - Lašťany

Se sídlem: Bělkovice-Lašťany č.p. 139, 783 16 Dolany

Zastoupená: Ing. Tomáš Němčíč – starosta obce

IČ: 00298654

(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 151 zákona č. 137/2006 Sb.

Osigeno s.r.o.

Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Víkřovice

Office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk

IČ: 27761746, DIČ: CZ27761746

Zapsán v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 51144

statutární orgán: Ing. Tomáš Rýc - jednatel

(dále jen „administrátor“),

Určeno pro:

DRAPLSTAV GROUP s.r.o.

Se sídlem: U Hřiště 413, 768 32 Zborovice

IČ: 01492853

zastoupen: Timoteus Políček - jednatel společnosti

(dále jen „uchazeč“)

Zadavatel rozhodl v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění (dále jen zákon) o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Zadavatel obdržel od uchazeče v rámci výběru dodavatele stavebních prací veřejné zakázky s názvem „Oprava místní komunikace k mateřské škole“ (dále jen „soutěž“) nabídku. Zadavatel

prostřednictvím hodnotící komise (dále jen „komise“) provedl v souladu s ust. § 76 zákona posouzení nabídky uchazeče, přičemž zadavatel postupoval především v souladu s ust. § 76 odst. 1 věta poslední zákona, kdy provedl posouzení nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací a výkazu výměr.


Při kontrole předložených výkazů výměr bylo zjištěno, že v předložených výkazech výměr uchazeč u položky č. 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ($254,4 \text{ m}^3$) uvedl nulovou cenu.

Uvedení nulových položek ve výkazu výměr je dle judikatury nepřípustné a zadavatelé jsou povinni uchazeče, jež předloží nabídku s nulovými položkami ve výkazu výměr, z účasti ve veřejné zakázce vyloučit.

Na základě výše uvedeného nezbylo hodnotící komisi, než v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona vyřadit nabídku a navrhnout zadavateli vyloučení uchazeče. Zadavatel na základě návrhu hodnotící komise rozhodl o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Toto rozhodnutí bylo schváleno Radou obce Bělkovice - Laštany dne 12.10.2016 usnesením č.j. 20/2016.

V Bělkovicích-Laštanech dne 17.10.2016


.....
OBEC
Ing. Tomáš Němec
BĚLKOVICE-LAŠTANY
Istar 1984, DIČ CZ00298654



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:
„Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště Bělkovice-Lašťany“

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelové hřiště Bělkovice-Lašťany“

Zadavatel: Obec Bělkovice-Lašťany
Bělkovice-Lašťany, 139, 783 16 Dolany u Olomouce
IČ: 00298654

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Vymezení předmětu plnění dle kódů CPV:

45212290-5 Opravy a údržba sportovních zařízení
45212200-8 Stavební úpravy sportovních zařízení
45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

Předmět plnění:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště Bělkovice-Lašťany na pozemcích parc. č. 328, 329, 331, k. ú. Bělkovice-Lašťany. Vedle doplnění a zhutnění pláň, položení nového sportovního povrchu z umělé trávy II. generace je navrženo i nové umělé osvětlení, tak, aby mohlo hřiště vyhovět kapacitně i zájemcům o sportování v odpoledních a večerních hodinách se sníženou viditelností. Jedná se o rovinatý pozemek, který je součástí sportovního areálu Bělkovice-Lašťany.

Zahájení zadávacího řízení

5.10.2016 – datum odeslání Výzvy k podání nabídek 5 vhodným uchazečům + zveřejnění Výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

Lhůta pro podání nabídek

12.10.2016, 12:00

1 Identifikační údaje oslovených uchazečů

- **Dne 5.10.2016 byla zveřejněna Výzva k podání nabídek na profilu zadavatele + byli vyzváni (emailem) k předložení nabídek tyto uchazeči:**

Název uchazeče	Datum odeslání/předání Výzvy k podání nabídky
SPORT CLUB s.r.o. Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČ: 26845431	5.10.2016*
SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 48035599	5.10.2016*



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:
„Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště Bělkovice-Laštany“

TUBEKO SPORT, spol. s r.o. Na Armádě 364, 270 62 Rynholec IČ: 49825020	5.10.2016*
JM DEMICARR s.r.o. Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna IČ: 63489163	5.10.2016*
StavoSport s.r.o. Přehradní 233, 763 16 Fryšták IČ: 29278481	5.10.2016*
*Doručení nabídek bylo ověřeno telefonicky i emailovou doručenou	

2 Identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena

Pořadí přijetí	Název uchazeče	Datum/ hodina přijetí nabídky	Způsob přijetí poštou/ osobní předání
1.	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 48035599	11.10.2016, 11:15	POŠTOU
2.	TUBEKO SPORT, spol. s r.o. Na Armádě 364, 270 62 Rynholec IČ: 49825020	11.10.2016, 11:15	POŠTOU
3.	StavoSport s.r.o. Přehradní 233, 763 16 Fryšták IČ: 29278481	11.10.2016, 11:15	POŠTOU
4.	JM DEMICARR s.r.o. Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna IČ: 63489163	12.10.2016, 8:55	OSOBNĚ

3 Průběh jednání hodnotící komise, posuzování nabídek a posouzení kvalifikace

Místo a termín <u>otevírání obálek</u> :	Zasedací místnost Obecního úřadu Bělkovice- Laštany, 12.10.2016, 14:00
--	---

3.1 Otevírání obálek

Kontrola nabídek byla provedena obdobně ve smyslu § 107 až § 110 zákona – umožnění oprávněným zástupcům uchazečů účastnit se otevírání obálek, kontrola doručení nabídek ve stanovené lhůtě a formálního označení obálky, případné sdělení identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení a údajů z nabídek číselně vyjádřitelných kritérií.

Při otevírání obálek neshledala komise žádných nedostatků v předložených nabídkách.



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:
„Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště Bělkovice-Laštany“

Místo a termín <u>jednání hodnotící komise:</u>	Zasedací místnost Obecního úřadu Bělkovice-Laštany, 12.10.2016, 17:00
---	---

3.2 Posouzení kvalifikace uchazečů

Posuzováno bylo prokázání:

- Základní způsobilosti
- Profesní způsobilosti
- Technické kvalifikace

Všichni uchazeči doložili dokumentaci prokazující kvalifikaci k plnění předmětu zakázky v odpovídajícím a žádoucím rozsahu.

Komise neshledala žádné nedostatky/nejasnosti v posuzovaných nabídkách z hlediska prokázání kvalifikačních předpokladů pro plnění zakázky.

3.3 Posouzení obsahu nabídky

Posuzováno bylo zachování podmínek zadavatele v rámci návrhu smlouvy, kde žádný z uchazečů neprovedl změn v jednotlivých ustanoveních smlouvy, obdobně též rozpočet, kde detailně bylo kontrolováno zachování původního zadání (neměnnost měrných jednotek, neodstraňování položek, oceňení všech požadovaných položek) a kontrola mimořádně nízkých nabídkových cen v jednotlivých položkách, v porovnání s cenami ostatních uchazečů a v porovnání s cenami projektovanými.

Komise v posuzovaných nabídkách neshledala žádné nedostatky/nejasnosti, všechny nabídky lze považovat za úplné, vyhovující a odpovídající zadávacím podmínkám.

Podrobně je proces otevírání obálek, posuzování kvalifikace a posuzování souladu nabídek se zadávacími podmínkami zaznamenán v následující **Vyhodnocovací tabulce:**




Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:

„Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště Bělčovice-Lašany“

VYHODNOCOVACÍ TABULKA:

UCHAZEČI	SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice IČ: 48035599	TUBEKO SPORT, spol. s r.o. Na Armádě 364 270 62 Rynholec IČ: 49825020	Stavošport s.r.o. Přehradní 233 763 16 Fryšták IČ: 29278481	JM DEMICARR s.r.o. Bučovická 180 684 01 Slavkov u Brna IČ: 63489163
Doručení nabídky - datum a hodina Označená obálka	✓ 11.10.2016, 11:15	✓ 11.10.2016, 11:15	✓ 11.10.2016, 11:15	✓ 12.10.2016, 8:55
Český jazyk	✓	✓	✓	✓
Krycí list (dle příl. č. 1 ZD) nabídky	✓ 10.10.2016	✓ 10.10.2016	✓ 10.10.2016	✓ 11.10.2016
Datum: Kdo podepsal:	Robert Běhal, Zdeněk Liška, na základě Plné moci	Ivan Šreiter, Václav Tuček, jednatelé	Marek Šmach, jednatel	Ing. Jan Zmrzlý, jednatel
Nabídka uchazeče dle hodnotících kritérií	1 805 151,--	1 904 334,--	2 009 138,--	1 681 640,--
Cena vč. DPH				
Prokázání základní způsobilosti – korektnost čestného prohlášení nebo relevantních dokumentů, podpis oprávněných osob (v souladu s OR nebo na základě Plné moci)	✓ 10.10.2016 Robert Běhal, Zdeněk Liška, na základě Plné moci	✓ ČP + Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů	✓ 10.10.2016 Marek Šmach, jednatel	✓ 11.10.2016 PaedDr. Miroslav Charvát, Ing. Jan Zmrzlý, jednatelé
Prokázání profesní způsobilosti - Výpis z obchodního rejstříku (prostě kopie) – ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky	✓ 12.9.2016	✓ 10.10.2016 (seznam kval. dodavatelů)	✓ 10.10.2016	✓ 29.7.2016
- Doklad o oprávnění k podnikání odpovídající předmětu veřejné zakázky (prostě kopie)	✓ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	✓ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	✓ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	✓ Provádění staveb, jejich změn a odstraňování



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:
„Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště Bělkovice-Laštany“

Technická kvalifikace – referenční osvědčení o min. 3 zakázkách relevantních k předmětu veřejné zakázky (nebo ČP)	V	V	V	V
Návrh smlouvy o dílo (příl. č. 4 ZD) - doplněné identifikační údaje, vyplněná cena souhlasí s krycím listem, rozpočtem, podepsaná oprávněná osoba, dodržení termínů, celkově nebyly prováděny žádné úpravy smlouvy oproti zadávacím podmínkám	V 10.10.2016 Robert Běhal, Zdeněk Liška, na základě Plné moci	V 10.10.2016 Ivan Šretter, Václav Tuček, jednatelé	V 10.10.2016 Marek Šmach, jednatel	V 11.10.2016 Ing. Jan Zmrzlý, jednatel
Vyplněný podrobný položkový rozpočet (příl. č. 3 ZD) - dodrženy požadavky technické specifikace provedení díla, v rámci podrobného rozpočtu žádná z položek nebyla uchazeči vyjmuta, změněna, byla ověřena korektnost výše DPH a součtu všech jednotlivých cen, pronásobení s měrnými jednotkami, v nabídkách nebyly měněny měrné jednotky, jednotlivé ceny lze považovat za relevantní (oproti cenám projektovaným i cenám ostatních uchazečů, žádný překlep v desetinném místě, který by vedl k podhodnocení celkové ceny) a celkově nebyly prováděny žádné změny oproti ZD	V 10.10.2016 Robert Běhal, Zdeněk Liška, na základě Plné moci	V 10.10.2016 Ivan Šretter, Václav Tuček, jednatelé	V 10.10.2016 Marek Šmach, jednatel	V 11.10.2016 Ing. Jan Zmrzlý, jednatel



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:
„Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště Bělkovice-Laštany“

4 Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek na základě hodnotících kritérií – zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky hodnotící kritérium **ekonomická výhodnost nabídky podle nejnížší nabídkové ceny (Kč vč. DPH)**.

HODNOCENÍ NABÍDEK DLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ:

P.č.	Firma	Hodnotící kritérium Nejnižší cena (Kč vč. DPH)	POŘADÍ
1.	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budejovice IČ: 48035599	1 805 151,--	2.
2.	TUBEKO SPORT, spol. s r.o. Na Armádě 364, 270 62 Rynholec IČ: 49825020	1 904 334,--	3.
3.	StavoSport s.r.o. Přehradní 233, 763 16 Fryšták IČ: 29278481	2 009 138,--	4.
4.	JM DEMICARR s.r.o. Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna IČ: 63489163	1 681 640,--	1.

Výsledek hodnocení nabídek:

Po provedení hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií stanovených v Zadávací dokumentaci předložila nejvýhodnější nabídku firma:

JM DEMICARR s.r.o. Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna IČ: 63489163

5 Závěrečné ustanovení

Zadavatel veřejné zakázky, Obec Bělkovice-Laštany, rozhodl o nejvýhodnější nabídce, kterou podala firma:

JM DEMICARR s.r.o.
Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
IČ: 63489163


Jestliže vybraný uchazeč odmítne akceptovat smluvní podmínky nebo neposkytne dostatečnou součinnost zadavateli k uzavření smlouvy, budou zadavatelem vyzváni další z hodnocených uchazečů dle pořadí nabídek.



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:
„Rekonstrukce sportovního povrchu víceúčelového hřiště Bělkovice-Laštany“

Právo zadavatele na zrušení výběrového řízení bez udání důvodů, ustanovené v zadávacích podmínkách, není – do okamžiku uzavření smlouvy – dotčeno.

Bělkovice-Laštany, 12.10.2016


..... OBEC
Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za
zadavatele, DIČ CZ00290654

Ing. Tomáš Němčic, starosta obce Bělkovice-Laštany

Obec Bělkovice – Lašt'any

IČ 00298654, DIČ CZ00298654

Bělkovice-Lašt'any č. p. 139, 783 16 Dolany

Příloha č. ³.....k zápisu č. 20 / 2016**Doklad č. 18****Rozpis rozpočtu – změna č. 11/2016**

Souhrnný doklad

Projednáno a schváleno v RO dne 12.10.2016

Výdajová část

§	POLOŽKA	ČÁSTKA V KČ	Text
3419	5492	5 000,00	Ostatní tělovýchovná činnost Dary obyvatelstvu – finanční dar p.Kubáčkovi – střelecké závody
3419	5222	- 5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3722	5139	10 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup materiálu j.n. - modré pytle, směs cihel-recykl.centrum
3722	6121	- 10 000,00	Budovy, haly, stavby
6171	5021	11 000,00	Činnost místní správy Ostatní osobní výdaje - právnícké služby
6171	5166	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby – Mgr. Frommer, p. Žmolíková
6171	5169	70 000,00	Nákup ostatních služeb – nákup stravenek
6171	5171	8 000,00	Opravy a udržování – servis Škoda Roomster
6171	5154	- 35 000,00	Elektrická energie
6171	5136	- 20 000,00	Knihy, učební pomůcky a tiskárny
6171	5168	- 21 000,00	Zpracování dat a služby souv. s inf. a komun.technol.
6171	5172	- 33 000,00	Programové vybavení

Ing. Tomáš Němčic
starosta obceDatum a podpis osoby odpovědné za provedení účetního záznamu :  (A. Teplá)

Smlouva o bezúplatném převodu majetku

uzavřená v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění
(dále jen smlouva)

č.j. předávajícího : HSOL-193-57/2016

č.j. převíjajícího :

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

zastoupená : plk. Ing. Karlem Kolářkem, ředitelem

IČ: 70885940

(dále jen předávající)

a

Obec Bělkovice-Lašťany

se sídlem Bělkovice-Lašťany 139, 783 16 Dolany u Olomouce

zastoupená: Ing. Tomášem Němčicem, starostou

IČ: 00298654

(dále jen převíjající)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s m l o u v u :

I. Předmět

1. Touto smlouvou předávající bezplatně převádí vlastnické právo k věcem uvedeným v odst. 2 tohoto článku a převíjající tyto přijímá.

2. Specifikace věcí :

4 ks Přílba H + Z F210 Schubert

nomenklatura 121206121978

sériové (výrobní) číslo 25,26,27,28

pořizovací cena 7 160,24 Kč/ks

2 ks svítidla ruční nabíjecí Stealthlite

nomenklatura 201005310019

sériové (výrobní) číslo 210,213

pořizovací cena 3 149,31 Kč /ks

2 ks svítidla ruční nabíjecí Stealthlite

nomenklatura 201005310019

sériové (výrobní) číslo 204,212

pořizovací cena 2 957,90 Kč/ks

4 ks svítidla čelová Petzl Zoom Halogene

nomenklatura 201005370335

sériové (výrobní) číslo #ZPV000013264-13267

pořizovací cena 1 340,00 Kč /ks

Účetní hodnota předávaného majetku činí **46 215,38 Kč**

(čtyřicetšesttisíc dvěstěpatnáct korun českých a 38 haléřů).

3. Předávající prohlašuje, že dosud hospodaří s výše uvedeným majetkem a je oprávněn k nakládání s ním, tento majetek však již nepotřebuje k plnění úkolů v rámci své působnosti a přesahuje jeho potřeby na základě rozhodnutí ev.č. HSOL-45/EKO-R-2016.
4. Přejímající prohlašuje, že je mu dobře znám stav předávaného majetku a že si jej prohlédl s tím, že stav odpovídá jeho stáří.

II. Účel, práva a povinnosti smluvních stran


1. Přejímající se zavazuje, že po dobu 3 let ode dne převodu vlastnického práva k majetku uvedeného v čl. I. této smlouvy bude majetek využívat ve veřejném zájmu pro účely požární ochrany, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, tj. výhradně pro potřeby jednotky SDH, nikoliv ke komerční či jiné výdělečné činnosti a to ani prostřednictvím třetí osoby.
2. Přejímající se dále zavazuje, že ve stanovené lhůtě 3 let ode dne převodu vlastnického práva nezciždí majetek uvedený v čl. I. této smlouvy, a to žádným způsobem.
3. V případě porušení povinností uvedené v odst. 1 tohoto článku předávající bezodkladně po zjištění této skutečnosti písemně vyzve přejímajícího k odstranění tohoto nežádoucího stavu v přiměřené lhůtě. Jestliže nedojde k odstranění nežádoucího stavu v přiměřené lhůtě je přejímající povinen zaplatit předávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den, v němž došlo k takovému porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení písemné výzvy předávajícího přejímajícímu. Zaplacením uvedené smluvní pokuty nedojde k zániku povinností dle odst. 1. tohoto článku a doba, po kterou trvá porušení, se nezapočítává do doby uvedené v odst. 1. tohoto článku. V případě, že bude nežádoucí stav i nadále přetrvávat, je předávající oprávněn uplatnit smluvní pokutu opakovaně nebo od této smlouvy odstoupit.
4. Odstoupit od této smlouvy je předávající oprávněn také v případě porušení povinností dle odst. 2. tohoto článku.
5. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména práva na smluvní pokutu, nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Předávající má v takovém případě právo požadovat vydání majetku specifikovaného v čl. I této smlouvy, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Majetek byl předán a převzat při podpisu smlouvy.
2. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž předávající obdrží dvě a přejímající jedno vyhotovení.
3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí přiměřeně ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.


Bělkovice-Lašťany

Za přejímajícího



Za předávajícího

plk. Ing. Karel Kolářík
ředitel



Obec Bělkovice - Laš'tany

Ing. Tomáš Němčic - starosta obce

Ing. Josef Zoula - místostarosta obce

Dětský bazén - letní koupaliště Bělkovice - Laš'tany**Stávající stav :**

Letní koupaliště v Bělkovicích nabízí svým návštěvníkům plavecký bazén a dětský bazén. Bazény jsou plněny a dopouštěny vodou z místní vodoteče.

Úpravna vody pro dětský bazén je společná s plaveckým bazénem a je umístěna v objektu strojovny technologie.

Dětský bazén

Jedná se o železobetonovou bazénovou vanu obdélníkového tvaru, opatřenou nátěrem modré barvy, o rozměru 20,2 x 8,2 m, s hloubkou 0,4 - 0,7 m (hloubka vody 0,2 - 0,5 m). Vodní plocha 165 m², objem cca 60 m³. Bazénová vana vykazuje zjevné známky poškození. Dochází také k únikům vody.

Požadavkem Vyhlášky 238/2011 Sb. je výměna vody ve venkovním dětském bazénu s hloubkou vody 0,5m, s recirkulací max. 1 x za 2 hodiny. Bazén je vybaven 5-ti stěnovými vtokovými tryskami a jedním dnovým výtokem. Odběr vody z hladiny je řešen dvěma stěnovými odtoky d 100 mm. Recirkulační systém úpravy vody dětského bazénu je společný se systémem plaveckého bazénu. Což neumožňuje dohřev vody v dětském bazénu.

Během provozu musí bazénová voda vykazovat vyhovující fyzikální, chemické, mikrobiologické a bakteriologické vlastnosti, nesmí ohrozit zdraví návštěvníků. Riziko možného přenosu infekce z vody, musí být odstraněno dezinfekcí. Bazénová voda musí během provozu vykazovat vlastnosti, limitované hodnotami, uvedenými ve vyhlášce 238/2011, v platném znění (se změnami 97/2014 Sb).

V bazénu musí být zajištěna kontinuální úprava vody, jejíž komponenty, rozvody, vtokové a sací trysky musí být navrženy tak, aby zajišťovaly požadovanou výměnu vody a bazén byl kontinuálně proplachován, bez zkratových proudů a míst s pomalou výměnou vody, příp. hluchých (necirkulovaných) míst.

Na základě požadavku provozovatele byla zpracována tato cenová nabídka na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (pro výběrové řízení), která zajistí řešení stavebních a technologických celků dětského bazénu, které uvedou zařízení do požadovaného stavu vyhovujícího současné legislativě a také bazén zatraktivní pro návštěvníky.

Navržené řešení :

Stěny stávajícího dětského bazénu budou odbourány a bude vystavěn nový moderní dětský bazén atraktivního tvaru, doplněný žádanými vodními atrakcemi.

Vodní plocha bude sestavena ze dvou obdélníkových segmentů. Bazén bude rozdělen na část pro menší děti, s nižší hloubkou vody cca 0,2 m, která bude propojena nerezovým skluzem s částí pro větší děti, s hloubkou vody vyšší, cca 0,5 m. Vstup do bazénu bude řešen ze dvou stran po vstupním

Strana 1 (celkem 4)

schodišti. V bazénu budou osazeny vodní atrakce. V hlubší části bude instalován vodní hřib, v části s nižší hloubkou bude osazen vodní ježek. Stěny a dno bazénové vany budou provedeny z železobetonu, s povrchovou úpravou z bazénové fólie. Dno celého dětského bazénu bude z bezpečnostních důvodů řešeno bazénovou fólií v protiskluzovém provedení.

V blízkosti nového dětského bazénu bude zřízena nová akumulční jímka a armaturní šachta. Zařízení úpravy vody - pískové filtry, čerpadla a také zařízení pro měření kvality vody a dávkování chemikálií, pro chemické a hygienické zabezpečení vody, bude umístěno ve stávajícím objektu strojovny technologie. Pro nové zařízení úpravy vody bude řešena nová elektroinstalace. Nová akumulční jímka, bude řešena samonosnou plastovou nádrží, osazenou pod terén na železobetonovou desku s obetonováním.

Plnicí a dopouštěcí voda bude přivedena do nové akumulční jímky.

Po obvodu nového bazénu bude proveden nerezový, hladinový přelivný žlábek - více než 2/3 obvodu. Nové přelivné žlábkové svedení budou svedeny do nové akumulční jímky. Do betonového dna bazénu budou uloženy rozvody sání a výtlačku. Riziko možného přenosu infekce z vody bude eliminováno dávkováním plynného chloru ze stávající chlorovny, k bakteriální úpravě vody.

Vypouštění bazénu bude řešeno napojením na stávající systém.

Na hranici čistého prostoru bazénů budou zbudována 2 nová ochozová brodítká se sprchami, jedno z brodítek bude řešeno pro imobilní osoby. Voda na sprchy ochozových brodítek bude brána z výtlačku recirkulačního okruhu plaveckého bazénu. Čistý prostor bazénu bude oddělen od travnatých ploch nízkým oplocením. Ochozové plochy budou vydlážděny - může být použita stávající zámková dlažba.

Dětský bazén bude doplněn vodními atrakcemi - vodní hřib a vodní ježek. Tyto atrakce zvýší atraktivitu celého zařízení. Pro napojení zvolených vodních atrakcí bude do dna bazénu uloženo také potrubí pro tyto atrakce. Vodní hřib bude osazen ve středu hlubší části bazénu. Vodní ježek bude osazen ve středu bazénu s nižší hloubkou vody. Uchycení atrakcí k bazénové vaně bude řešeno typizovanými úchyty, dle výrobce.

Hrubý odhad investičních nákladů, bez DPH

3 000 000,00 - 3 500 000,00 Kč

V případě Vašeho zájmu Vám zpracujeme jednostupňovou projektovou dokumentaci, jejíž součástí bude i položkový rozpočet a podrobný výpis materiálu.

Cena jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro realizaci stavby, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, bez DPH 49 800,00 Kč


Cena zahrnuje jednostupňovou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, v rozsahu profesí :

- stavební část
- bazénová technologie
- elektroinstalace
- položkový rozpočet s výkazem výměr
- inženýrská činnost


Cena nezahrnuje správní poplatky.

Termín dodání PD : do 45 dnů od doručení objednávky


Letní koupaliště Chropyně - dětské brouzdaliště - realizace GHC Invest, s.r.o., 2016

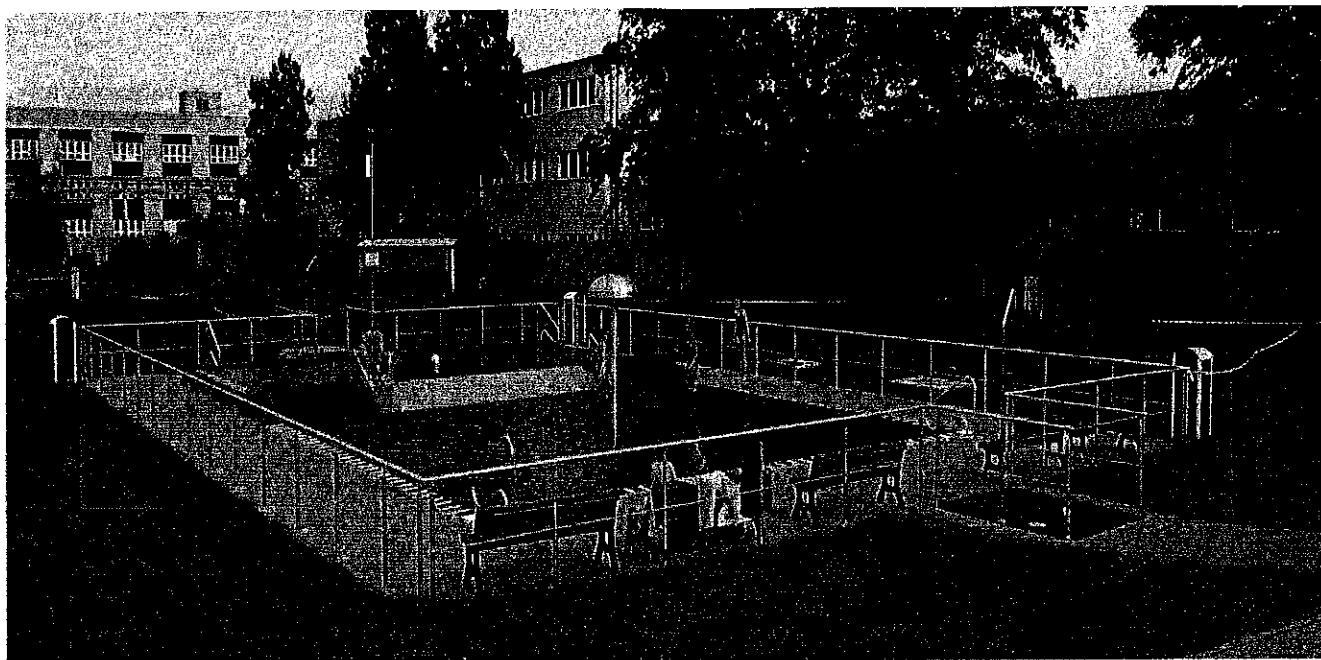

Letní koupaliště Zdice - dětský bazén - realizace GHC Invest, s.r.o. , rok 2013

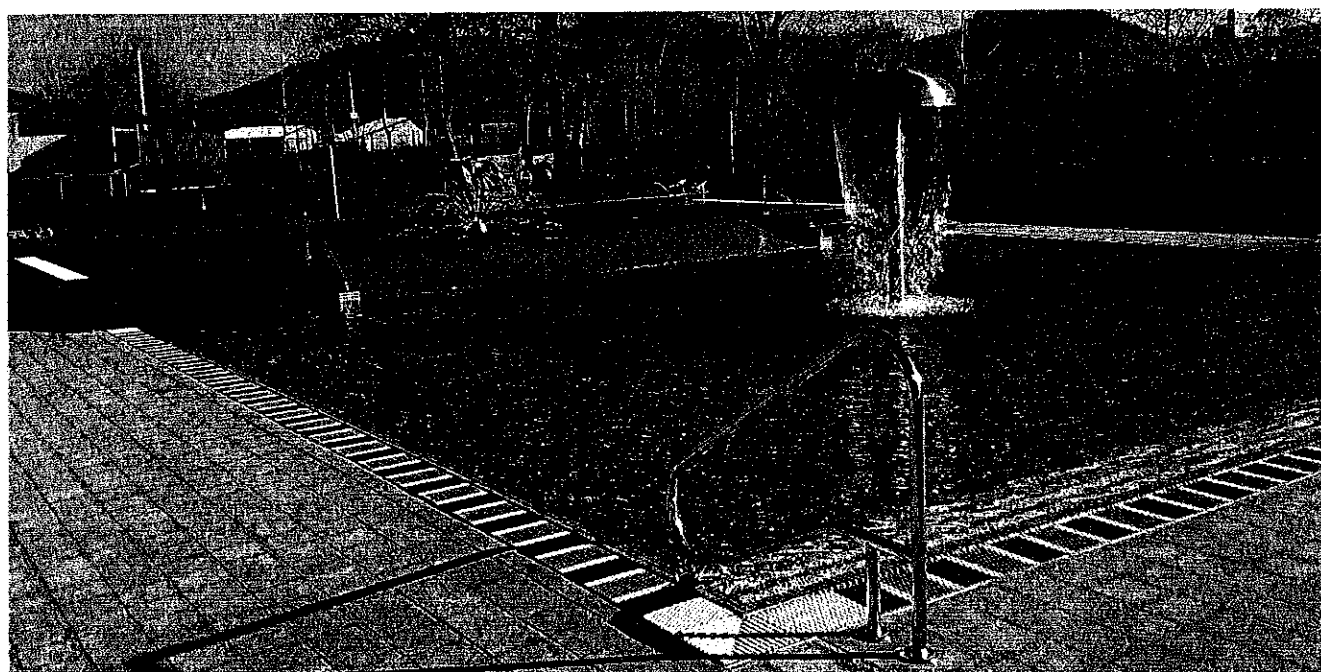

Letní koupaliště Koryčany - dětské brouzdaliště - realizace GHC Invest, s.r.o. , 2016

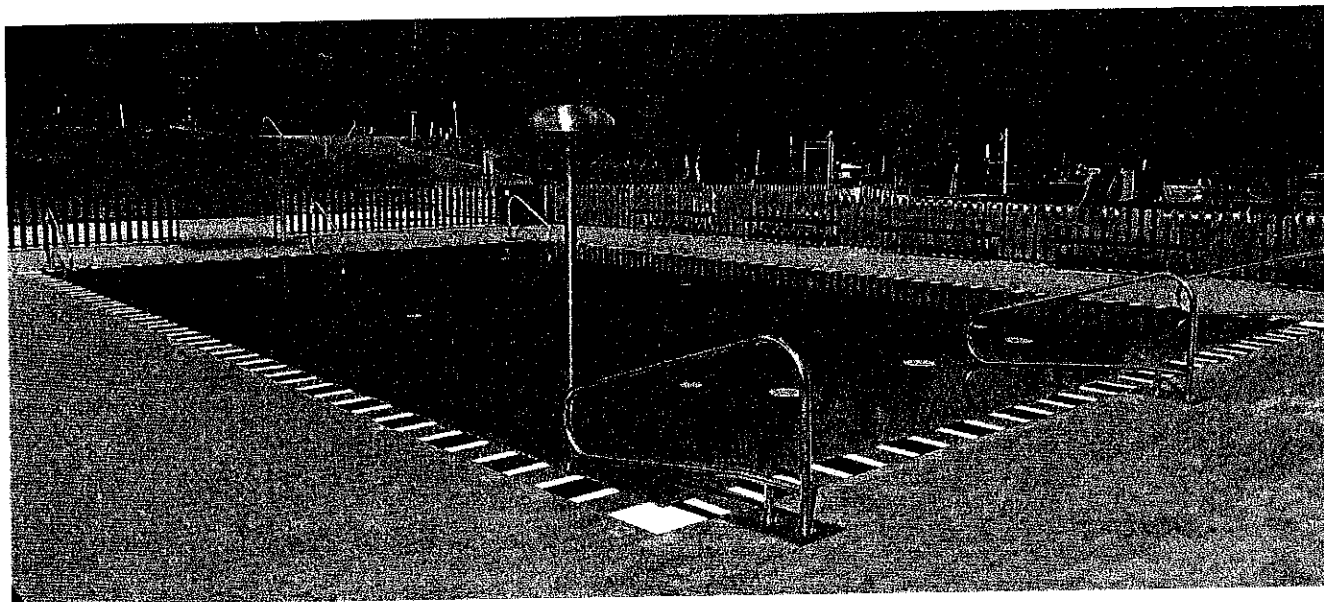

V Přerově, 6.10. 2016

Vypracoval : Daniel Masařík
GHC Invest, s.r.o.
obchodně technický poradce
tel: 731107048

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci díla s názvem:

„Výstavba zpomalovacích prahů na místní komunikaci 21b – Bělkovice-Lašťany“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Bělkovice-Lašťany

Se sídlem: Bělkovice-Lašťany 139, 783 16 Olomouc

IČ: 002 98 654

Zastoupena: Ing. Tomášem Němčicem, starostou obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Tomáš Němčic, starosta obce

technický dozor investora – v zastoupení

telefon/mobil: 602 776 606

e-mail: nemcic@belkovice-lastany.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 1801715369/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Antonín Brodacký s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku (živnostenském rejstříku), vedeném Krajským soudem Ostrava oddíl C vložka 45271 zapsaný dne 12. dubna 2011

Se sídlem: Bělkovice-Lašťany 535

IČ: 286 54 501

DIČ: CZ 28654501

Zastoupený: Antonínem Brodackým, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Antonín Brodacký – jednatele

telefon/fax: 603 233 468

e-mail: brodacky@cmail.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-918059247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

na dodávku stavby s názvem

„Výstavba zpomalovacích prahů na místní komunikaci 21b – Bělkovice-Lašťany“

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna čl. III. Termín plnění.

Ke změně termínu dochází na základě prodloužení lhůty pro vydání stavebního povolení pro tuto akci.

Nově tento článek zní takto:

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech provádění díla, tj. všech jeho částí:
 - a) Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací
do 3 dnů od předání staveniště
 - b) Termín dokončení a předání díla do
7 týdnů od zahájení stavebních prací
2. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení celé stavby dle čl. II. této smlouvy, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelům požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad, nedodělků, předání geodetického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu a uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do nového (opraveného stavu) či původního stavu.
3. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce dle čl. II. odst. 10. a 11. této smlouvy nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
4. Objednatel přistoupí po dohodě se zhotovitelem na přiměřené prodloužení termínu dokončení díla v následujících případech:
 - a) dojde-li z důvodu na straně objednatele k prodloužení s předáním a převzetím staveniště (termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodloužení objednatele s předáním staveniště);
 - b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací, nejedná-li se o

- případ uvedený v čl. III. odst. 3. této smlouvy;
- c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. „Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady obce Bělkovice-Lašťany č.20/2016 ze dne 12.10.2016.

V Bělkovicích-Lašťanech dne 12.10.2016

Objednatel:

.....
Obec Bělkovice-Lašťany
Ing. Tomáš Němčic
starosta obce

V Bělkovicích-Lašťanech dne 6.10.2016

Zhotovitel:

.....
Antonín Brodacký s.r.o.
Antonín Brodacký
jednatel společnosti
